HARVARD | BUSINESS | SCHOOL

606-S14

REV. 22 DE ENERO DE 2003

ROBERT D. AUSTIN

DEBORAH SOLE

MARK J. COTTELEER

La selección de software empresarial de Harley Davidson Motor Company

Nos encontrábamos en McDonald's celebrando nuestra primera reunión de planificación del proyecto SiL'K, cuando de repente oímos un tiroteo procedente de la zona de aparcamiento. En el restaurante se escucharon los primeros impactos de balas. Alguien dijo, "Todo el mundo al suelo, cierren las puertas". Todos nos escondimos debajo de la mesa. Me encontraba tirado en el suelo, mirando a Dave y a Pat. Pensaba entonces, "Santo Dios, esto no es posible". Fue realmente increíble. Una auténtica experiencia que nos unió para siempre.

—Garry Berryman, vicepresidente de Gestión de Materiales

David Cotteleer, director de Sistemas de Información (SI) del proyecto denominado *Supplier Information Link* ó SiL'K (en español, "Acceso a información sobre proveedores"), sonreía mientras recordaba los momentos de terror y la camaradería posterior que surgió entre todos los que habían vivido aquellos momentos tan poco corrientes de comienzo de un proyecto. De esa manera se había fijado el tono de la relación personal que se estableció entre Garry Berryman, Pat Davidson, directora de Compras, Planificación y Control, y él mismo, en la época en que empezaban a trabajar juntos en la determinación de las especificaciones de un sistema integrado de compras que proporcionase el soporte necesario a la nueva Estrategia de Gestión de Suministros (en inglés, *Supply Management Strategy* ó SMS) de la compañía.

Ahora, él y el equipo del proyecto SiL'K se encontraban reunidos en su "sala de guerra" situada en la planta más alta del edificio de la sede central de la empresa Harley-Davidson, con el fin de hacer frente a otro momento crítico en la historia del proyecto. Después de tres meses de gran actividad dedicados a reunirse y negociar con proveedores potenciales de software, a analizar y revisar la documentación presentada y a evaluar los paquetes de software ofrecidos, el equipo del proyecto SiL'K tenía que tomar la decisión final. ¿A quién elegirían como suministrador y socio a la hora de poner en funcionamiento un sistema integral de gestión de proveedores y de compras para toda la empresa? ¿En qué criterios debería basarse una decisión de ese tipo? Y, por último, ¿Habían hecho todo lo posible para poder tomar la decisión más acertada?

Caso preparado por la candidata de doctorado Deborah Sole y Mark J. Cotteleer investigador, post-doctorado, bajo la supervisión del profesor Robert D. Austin. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios, o ejemplos de una administración buena o deficiente.

Copyright © 1999 President and Fellows of Harvard College. Para solicitar copias o permiso para reproducir material, llamar por teléfono al 1-800-545-7685, o escribir a: Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163, o entrar en http://www.hbsp.harvard.edu. No se permitirá la reproducción, almacenaje en sistemas de almacenaje, el uso en una planilla de cálculo o la transmisión en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación u otro procedimiento, sin permiso del Harvard Business School.

La empresa Harley-Davidson Motor Company

La sociedad *Harley-Davidson Motor Company* se creó en un cobertizo en el año 1903, cuando los jóvenes William Harley y Arthur Davidson empezaron a hacer experimentos acerca de "cómo aprovechar los resultados de conducir sobre dos ruedas"[1]. En el año 1920, la empresa se había convertido ya en el primer fabricante del mundo de motocicletas, con una producción superior a las 28.000 motos al año y con distribuidores de sus productos en sesenta y siete países. En 1998, Harley-Davidson vendió 150.818 motocicletas en todo el mundo, con un aumento respecto al año anterior del catorce por ciento, cifra cada vez más próxima a la fijada en su ambicioso Plan 2003 que preveía un aumento espectacular de su capacidad de producción al llegar el momento de cumplirse los cien años desde el nacimiento de la empresa.

La mayor parte de los ingresos y de los beneficios de la empresa procedían de la venta de motocicletas y de productos relacionados con ellas (véase el **Anexo 1**). Harley-Davidson contaba con una plantilla próxima a los seis mil empleados y mantenía más de seiscientos concesionarios de propiedad independiente en Estados Unidos. Su sede social se encontraba situada en Milwaukee, en el Estado de Wisconsin y la empresa poseía centros de fabricación en ese mismo Estado, así como en los de Pennsylvania y Missouri (véase el **Anexo 2a**), además de filiales propiedad total de la compañía en Alemania, el Reino Unido, el Benelux, Francia y Japón.

Harley-Davidson competía principalmente en el mercado de motocicletas de gran potencia (de cilindrada superior a los 651 centímetros cúbicos) con las producidas en esta categoría por Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. La feroz competencia de los fabricantes japoneses, unida al rápido aumento de la producción de Harley-Davidson, así como a los problemas de calidad derivados de ello, habían hecho que la compañía se encontrara al borde de la quiebra a mediados de los años ochenta. Esa crisis había desencadenado la adquisición de la sociedad por parte de sus propios directivos y posteriormente un cambio de enfoque de dirección basado en la calidad que terminó con éxito en la oferta pública inicial de acciones (OPV) del año 1986. Las cifras relativas al número de matriculaciones realizadas en todo el mundo durante los meses de octubre y noviembre de 1998 pusieron de manifiesto que el mercado objetivo al que se dirigía Harley-Davidson había crecido en un 13,8 por ciento respecto a las del año anterior. En ese mismo período, la empresa había incrementado sus ventas en un 14,3 por ciento. El renacimiento experimentado por Harley-Davidson era considerado por algunos analistas del sector como la reafirmación simbólica de la buena capacidad productiva de Estados Unidos, así como prueba de que las empresas industriales estadounidenses podían competir con sus rivales exteriores.

Durante el transcurso de sus noventa y cinco años de vida comercial, la marca Harley había logrado adquirir un poder casi místico. Muchos de sus clientes eran capaces de esperar hasta dos años para poder conseguir una motocicleta. Por lo general, se consideraba que los motoristas que adquirían las Harley-Davidson eran personas jóvenes, temerarias y como decía la canción "nacidas para ser libres". Sin embargo, gran parte del reciente ritmo de crecimiento de la empresa provenía de motoristas con alrededor de cuarenta años de edad y con hijos mayores ya independientes. Ese tipo de clientes se sentía enormemente atraído por los sueños de aventura y de libertad que ofrecían los viajes en moto, además de contar con el dinero suficiente para poder permitirse ese lujo y diversión. A pesar del aburguesamiento de sus clientes, Harley-Davidson seguía estando encantada de transmitir a través de su imagen (según admitía el propio consejero delegado de la empresa Jeff Bleustein) la idea de "ser algo un poco especial, un poco misterioso, un poco diabólico"[2].

Harley-Davidson valoraba tanto la participación individual como el trabajo en equipo. La compañía aplicaba el concepto de "equipos de trabajo autodirigidos", desde los escalones más bajos de la planta de fabricación hasta la alta dirección. En lugar de contar con una jerarquía

[1] Véase la página Internet de Harley-Davidson en la dirección http//www.harley-davidson.com/

[2] Gina Imperato, *Harley shifts gears*, artículo publicado en *FastCompany*, núm. 9, junio de 1997, pág. 104.

organizada de manera funcional, la estructura organizativa de la empresa estaba formada por tres "círculos" entrelazados, que correspondían a las áreas de "Creación de la Demanda" (CDC, según sus siglas en inglés), "Grupo de Fabricación" (PPG, según sus siglas en inglés) y "Actividades de Soporte" (PSC, según sus siglas en inglés). El grupo de Creación de la Demanda era responsable de todas las cuestiones relacionadas con las ventas y el marketing. El Grupo de Fabricación se encargaba del desarrollo y la producción. Por último, el grupo de Actividades de Soporte era el encargado de satisfacer las necesidades de la empresa en materia jurídica, financiera, de recursos humanos y de comunicación. Esos tres círculos eran dirigidos por comités permanentes, también conocidos como "Círculos de Dirección". Un Consejo de Dirección y Estrategia, compuesto de directivos pertenecientes a los tres grupos, era el encargado de supervisar los círculos con el fin de asegurar que se mantenía una visión integrada de la dirección central de la compañía (véase el **Anexo 2b**).

La organización del área de Sistemas de Información

El trabajo en equipo también desempeñaba un papel muy importante en la estructura del área de Sistemas de Información de Harley-Davidson. En lugar de contar con un director general de Informática como la mayoría de las empresas, Harley-Davidson poseía una "Oficina de dirección general de Informática" en la que tres "directores generales" se encargaban de dirigir todas las actividades relacionadas con los sistemas de información. Cory Mason, director de Sistemas de Información del Grupo de Fabricación, aseguraba que "en la cultura cooperativa de esta organización, está aceptada la idea de compartir el liderazgo". De la manera siguiente describía con mayor detalle la necesidad de contar con tres personas que compartieran la responsabilidad del cargo de director general de Informática:

> La alta dirección de la empresa quiere que el director general de Informática sea su consultor interno, que le asesore y dirija en todo lo que se refiere a la capacidad de las nuevas tecnologías para crear valor empresarial. El problema es que ese ámbito de actuación es demasiado extenso para que una sola persona pueda ocuparse de ella de manera eficiente. Por el contrario, en nuestro caso cada uno de los directores de Sistemas de Información está perfectamente integrado en las decisiones comerciales y empresariales de uno de los círculos en los que está dividida la empresa y todos juntos, con el vicepresidente de Planificación Estratégica y Servicios de Información, son capaces de crear negocios perfectamente coordinados y capacidades informáticas para toda la compañía.

Con el propósito de guiar los resultados en materia de sistemas de información, cada uno de los "Círculos de Dirección" contaba con su propio Círculo de Tecnologías de la Información (ITC, según sus siglas en inglés), en el que participaban dos altos directivos de sistemas informáticos y dos usuarios finales que representaban a cada centro de trabajo y a cada área. El cometido del Círculo de Tecnologías de la Información era conocer los procesos y las interacciones de los diversos grupos, así como decidir, desde un punto de vista comercial, dónde debería el grupo concentrar sus capacidades tecnológicas. En el Grupo de Fabricación, el Círculo de Tecnologías de la Información contaba con todas las facultades necesarias para poder tomar las decisiones relacionadas con la inversión en nuevas tecnologías. La dirección de la empresa pensaba que el Círculo de Tecnologías de la Información era el más capacitado para conocer las necesidades de los negocios, ya que se encontraba más próximo a las actuaciones prácticas de la empresa.

La organización del área de Compras

Al formar parte del Grupo de Fabricación, la organización del área de Compras estaba perfectamente integrada en las actividades de ingeniería y de producción. Había un grupo de

desarrollo de compras asignado al área de ingeniería del Centro de Desarrollo de Productos (PDC, según sus siglas en inglés) de Harley-Davidson. Había también grupos con actividades de compras asignados a sus homólogos de producción en las plantas e instalaciones de fabricación. Además, existía un grupo centralizado de control y planificación de compras que tenía sus oficinas en la sede central de la empresa en Milwaukee. La dirección del área de Compras corría a cargo del Grupo de Unidad de Compras (PUG, según sus siglas en inglés), en el que participaban directivos de compras que representaban a los diferentes centros de producción de Harley-Davidson. En ese Grupo de Unidad de Compras también participaban representantes de las operaciones de compras de las divisiones de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones (MRO, según sus siglas en inglés), de Equipamientos Originales (OE, según sus siglas en inglés), de Piezas y Accesorios (P&A, según sus siglas en inglés) y de Artículos Varios (GM, según sus siglas en inglés)[3].

Con el paso de los años, se había ido fomentando cada vez más la independencia de los centros de producción, lo cual había dado como resultado la aparición de diferentes métodos de gestión de las compras, incluida la adquisición y el desarrollo de distintos sistemas de información para el área de Compras. Por ello, no sólo eran independientes los sistemas correspondientes a las divisiones de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones y de Equipamientos Originales, sino que incluso sistemas suministrados por el mismo proveedor se habían modificado para responder a necesidades específicas de los centros de fabricación locales. Así, por ejemplo, el sistema del departamento de OE de la planta de Harley-Davidson en York (Pennsylvania) era distinto del sistema de OE de Kansas City, y ambos eran a la vez diferentes de los sistemas del departamento de OE de las plantas de producción del tren de fuerza (*Powertrain*)[4].

Establecimiento del marco necesario para una Estrategia de Gestión de la Cadena de Suministros

En el momento en que Garry Berryman se incorporó a Harley-Davidson en el año 1995, se convirtió en un motor determinante del cambio en el área de Compras. En función de su experiencia anterior en las empresas John Deere y Honda, Berryman buscó nuevas oportunidades para ampliar la función del área de Compras a través de la visión corporativa que se incluía en el denominado "Plan 2003". Berryman pensaba que la relación con los proveedores "no era considerada por la empresa como una oportunidad estratégica para acelerar el tiempo de puesta en el mercado, reducir los costes y aumentar la calidad de los productos". Debido a que las piezas compradas externamente representaban del 55 al 60 por ciento del valor de una motocicleta, Barryman estaba convencido de que si la organización de compras pudiera al principio influir en los costes, todo lo demás se adaptaría en cuanto al soporte interno necesario para cambiar la manera en que la compañía se relacionaba con el conjunto de sus proveedores. Garry Berryman deseaba que la organización de compras se convirtiera en un punto de contacto común para toda la empresa respecto a aquellos proveedores que fuesen auténticos socios del negocio de Harley-Davidson.

A las órdenes de Berryman, la organización de compras empezó a elaborar en el año 1996 la denominada oficialmente "Estrategia de Gestión de Suministros" (SMS, según sus siglas en inglés) para toda la compañía. El objetivo de la SMS era "asegurar que Harley-Davidson recibe el

---

3 La división de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones se ocupa de artículos consumidos durante el proceso de fabricación; por ejemplo, componentes de los elementos de la maquinaría y aparatos de limpieza. La división de Equipamientos Originales trata de componentes que se incluyen en el producto; por ejemplo, piezas de la motocicleta compradas internamente. La división de Piezas y Accesorios se ocupa de elementos y componentes para su uso después de la venta del producto. Por último, La división de Artículos Varios se ocupa de la ropa de la marca Harley-Davidson, de objetos coleccionables y de otros productos de marca autorizados.

4 El denominado "tren de fuerza" incluye el motor y los elementos de transmisión de la motocicleta.

producto más adecuado, en el momento preciso, con la máxima calidad y el menor coste posible"[5]. Uno de los elementos más importantes del proyecto era establecer claramente la distinción entre un "vendedor" y un "suministrador". Berryman hablaba así con más detalle de esa diferencia:

> Un vendedor es aquella persona que uno puede encontrar en cualquier esquina. Todo lo que debe hacerse en esos casos es conseguir el producto que uno ve, sin obtener nada más relacionado con él, en cuanto a innovación, creatividad y compromiso con el éxito de nuestro negocio. Sin embargo, el suministrador es una extensión de nosotros mismos; representa una oportunidad para extender nuestro negocio principal a otras organizaciones que puedan aportar nuevas competencias al desarrollo del producto y a la innovación.

A lo largo del año 1996, Berryman y el Grupo de Unidad de Compras implicaron en ese trabajo a otras áreas de la empresa y a las principales compañías suministradoras de Harley-Davidson, con el fin de dar forma a los objetivos de la Estrategia de Gestión de Suministros y de asegurar su participación en el perfeccionamiento futuro de la estrategia. Cuando se publicó la SMS a finales de 1996, Berryman estaba convencido de que se habían incorporado realmente los puntos de vista de todas las partes interesadas en el proyecto.

Uno de los elementos clave de la Estrategia de Gestión de Suministros era la necesidad de cambiar la organización y hacer que pasase de tener una mentalidad de realización de transacciones a corto plazo a tener una visión a largo plazo de las relaciones con los suministradores. La asignación de proveedores a centros específicos de producción y su integración en el proceso de desarrollo de Harley-Davidson, eran elementos fundamentales para la consolidación de las relaciones a largo plazo pero, sin embargo, se trataba de objetivos que no podían ser alcanzados por el área de Compras en solitario. Garry Berryman hacía hincapié en cómo los equipos de plataformas[6] dedicados al desarrollo de nuevos productos se habían ido convenciendo poco a poco de que el área de Compras no podía aprovechar al máximo los recursos de los proveedores sin ayuda de otras áreas, y de que ellos mismos eran los responsables de elaborar un programa de trabajo destinado a convencer a los suministradores de la importancia de su colaboración en el proceso.

Los valores y la voluntad de Harley-Davidson de probar nuevas vías eran fundamentales a la hora de facilitar el cambio en la perspectiva de las relaciones con los proveedores. Garry Berryman reconocía que estar en situación de igualdad con respecto a las áreas de Ingeniería y de Fabricación era primordial para poder alcanzar el objetivo final de la nueva Estrategia de Gestión de Suministros. Por último, la participación de todas las divisiones funcionales de la empresa era esencial para poder vender dicha estrategia. De esa manera, Berryman afirmaba lo siguiente:

> De lo que se trata simplemente es de estar presentes en cada uno de los principales segmentos de la compañía, de manera que podamos hacer oír allí nuestra voz y que los empleados no olviden el importante papel de la gestión de suministros. Es preciso que participemos en todos los debates y foros importantes que tienen lugar en la empresa para asegurarnos de que no se olvida [la estrategia].

Garry Berryman sostenía que era necesario aplicar un enfoque gradual y constante con el fin de conseguir la confianza, el entusiasmo y el compromiso precisos con respecto a la Estrategia de Gestión de Suministros. Además, insistía en que la nueva manera de pensar debería institucionalizarse en la empresa antes de empezar a hacer frente a los cambios en los procesos y

---

[5] Boletín informativo del proyecto SiL'K, núm. 1, año 1998.

[6] Un equipo de plataforma es un grupo de trabajo multifuncional de desarrollo de nuevos modelos, en el que participan representantes de las áreas de ingeniería, de fabricación, de compras y de marketing.

las tecnologías. Berryman hacía especial hincapié en este punto, para lo cual citaba textualmente de su versión de bolsillo del libro "El arte de la guerra"[7] lo siguiente:

> "Cuando tu estrategia es seria y de gran alcance, lo que ganas con tus cálculos es mucho. Por ello, puedes vencer antes de empezar el combate". Yo creo precisamente que eso es lo que estamos haciendo aquí. Son demasiadas las ocasiones en que hacemos justo lo contrario. "Cuando tu pensamiento estratégico es superficial y corto de vista, lo que ganas con tus cálculos es muy poco. Por ello, siempre sales perdiendo incluso antes de empezar la batalla". Podemos permitirnos el lujo de tomarnos el tiempo que haga falta para que las cosas salgan bien. Es muchísimo mejor que no seamos impacientes, sino que seamos reflexivos para asegurarnos de que lo hacemos bien, porque no vamos a tener una segunda oportunidad. En mi opinión, la clave de este asunto es hacer que se comprenda perfectamente la nueva estrategia en toda la empresa.

La necesidad de ser valientes a la hora de afrontar el pensamiento transformacional

Después de un año de adoctrinamiento y de varias revisiones, llegamos a la conclusión de que este proyecto era firme como una roca. Empezamos a oír hablar a empleados de toda la empresa acerca de la Estrategia de Gestión de Suministros como de una cosa propia. Supimos entonces que ya había llegado el momento de iniciar los cambios en nuestro proceso y de presentar el conjunto de herramientas que teníamos para gestionar ese proceso.

—Garry Berryman

Cory Mason preveía dos obstáculos principales a la hora de introducir los cambios en los procesos y los sistemas de compras. El primero de ellos era la consideración absolutamente primordial dada por Harley-Davidson a la demanda insatisfecha y el temor a que cualquier cambio pudiera afectar a la producción. Así, Mason afirmaba lo siguiente:

> Tenemos empleados que lo que más les importa es que las líneas de producción no dejen de funcionar. Cuando uno cuenta con esa actitud reacia a alterar de cualquier forma las líneas de producción, surgen barreras muy importantes que uno debe superar cuando trata de convencer a otros para que cambien (en algunos casos de manera radical) sus procesos y procedimientos.

El segundo obstáculo identificado por Mason, problema común al que se enfrentaban los equipos de proyecto, era la "proclividad natural de la compañía a realizar mejoras continuas, en lugar de transformar las áreas de negocios".

Pat Davidson explicaba así por qué el cambio no era una cosa fácil en la compañía:

Estamos profundamente enraizados en nuestro pasado. Creo que también forma parte de ello la manera en que ha evolucionado nuestra gama de productos. Contamos con unos ciclos de vida de nuestros productos enormemente largos[8]. No realizamos cambios en los productos de manera frecuente. Siempre hacemos mejoras, pero nunca se han producido cambios radicales a mayor escala, salvo en los casos en que se han dado circunstancias excepcionales que lo hayan requerido.

La combinación de un enorme valor potencial y de los cambios que deberían producirse hizo que la dirección de Sistemas de Información fuese cautelosa con respecto a esta iniciativa estratégica que giraba en torno a un proyecto de mejora continua. Debido a la tradicional

---

[7] Sun Tzu (siglo V antes de Cristo) *The Art of War* ("El arte de la guerra"), traducción al inglés publicada por *Penguin Classics* (año 1974), pág. 10.

[8] Por ejemplo, el diseño del motor original de cilindros dobles en V, fabricado por primera vez en el año 1909, todavía se utiliza en motocicletas fabricadas en la actualidad. Es preciso hacer hincapié en que la evolución de los productos de Harley-Davidson está enormemente influida por la fidelidad inquebrantable de sus clientes y por su apego a la tradición.

autonomía existente en las áreas funcionales de Harley-Davidson, Cory Mason sabía que si debía producirse un cambio transformacional era absolutamente imprescindible convencer de ello a la dirección del área de Compras y hacer que se comprometiera antes de pedirle que proporcionase recursos para un gran proyecto de sistemas. Con el propósito de hacer que la organización se comprometiese a buscar nuevas vías de experimentación, Mason convocó al Grupo de Unidad de Compras para una reunión fuera de las instalaciones de la empresa con el fin de realizar una sesión de *brainstorming* y de animarles a que "fueran valientes" a la hora de afrontar nuevos hechos y de pensar en cambios radicales en sus procesos de compras. Al recordar los resultados logrados aquel día, Mason afirmaba que "Ese debate con el equipo directivo del área de Compras logró sentar las bases para que realmente pensasen en las compras de manera distinta".

El proyecto "Acceso a información sobre proveedores" (*Supplier Information Link* ó SiL'K)

Mientras que Garry Berryman y Cory Mason se dedicaban a buscar el compromiso de la dirección de Harley-Davidson con respecto al Sistema de Gestión de Suministros (SMS), David Cotteleer y Pat Davidson empezaron a estudiar las posibilidades de aplicar nuevos sistemas y procesos. Había mucho descontento con relación a los sistemas ya existentes en la empresa, así como un cierto desequilibrio con el SMS, que dependía de las personas que poseían las capacidades, los recursos y el tiempo necesario para dedicarse a la labor de establecer las relaciones con los proveedores. En el mes de octubre de 1997, Cotteleer y Davidson realizaron una presentación al Grupo de Unidad de Compras en la que se hacía una "propuesta de valor" destinada a promover cambios importantes en cuanto a personal, procesos y nuevas tecnologías[9]. Entre los elementos más destacados de la propuesta de valor estaban las reducciones previstas en los costes de compra para los cinco años siguientes, que serían del orden de 34 millones de dólares estadounidenses, así como muchos otros beneficios menos tangibles (véase el **Anexo 3**).

La creación de un equipo de proyecto

En la presentación realizada al Grupo de Unidad de Compras, Cotteleer y Davidson solicitaron recursos a tiempo parcial a cada una de las organizaciones de compras para poder continuar con el proyecto. Gracias al apoyo brindado por Garry Berryman, fueron capaces de conseguir que participaran algunos de los directivos más importantes del Grupo de Unidad de Compras (véase el **Anexo 4**). David Cotteleer explicaba así la elección hecha de participantes:

> Queríamos implicar a los mejores, a personas consideradas líderes en la creación de opiniones en sus organizaciones, a personas que conociesen perfectamente los procesos existentes y que fueran usuarios muy exigentes cuando llegase el momento de implantar el proyecto, si es que finalmente llegábamos a ello. Deseábamos estar seguros de que cuando hubiésemos acabado, el proyecto ya contaba con los apoyos necesarios para su puesta en funcionamiento y que esas personas influirían realmente en sus propias organizaciones asegurándoles que eso era precisamente lo que necesitaban.

Mediante la utilización del Sistema de Gestión de Suministros como punto de partida, el equipo del proyecto SiL'K intentó pasar de la "estrategia a la acción" con objeto de definir los requisitos y las capacidades necesarias para llevar a la práctica esa visión estratégica. El equipo se reunió de tres a cuatro días todos los meses entre noviembre de 1997 y abril de 1998. Chuck Braunschweig, del grupo de Innovación de Procesos de Harley-Davidson, se incorporó al equipo durante el mes de enero de 1998 y actuó de impulsor de dos actividades de gran importancia: la

[9] Todos los proyectos de sistemas de información de Harley giraban en torno a los tres elementos siguientes: procesos, personal y nuevas tecnologías, que conformaban su modelo de Integración de Negocios (BI, según sus siglas en inglés).

determinación de los procesos reales de compras y la realización de una encuesta entre todas las partes implicadas.

La determinación de los procesos "reales" de compras

Realmente empezamos a ganar fuerza como equipo en el momento en que comenzamos a hablar del flujo de procesos. Contábamos con al menos tres procesos centrales diferentes, pero afirmábamos que queríamos pensar en los flujos en función de las similitudes que nos unían y no de las diferencias que nos separaban. Y si podemos pensar en ello basándonos en las prácticas y en los procesos comunes, entonces seremos capaces de crear un sistema común para todos.

—Chuck Braunschweig

A partir del empleo de recientes diagramas de los procesos empleados por las divisiones de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones y de Equipamientos Originales de cada uno de los centros de producción, el equipo de trabajo del proyecto SiL'K creó un mapa de procesos de toda la empresa relativo a las actividades de compras, al que se fueron incorporando gradualmente los procedimientos de las unidades de compras de las divisiones de Piezas y Accesorios, de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones y de Equipamientos Originales. A pesar de la diversidad de sus procesos respectivos, gracias a este ejercicio el equipo fue capaz de identificar muchas características comunes en los diversos centros de fabricación.

La encuesta a las partes implicadas

Aunque muchos de los participantes en el equipo de trabajo pensaban que ya conocían los principales problemas y que deberían seguir adelante determinando los requisitos del sistema, Chuck Braunschweig les convenció de la importancia de realizar una encuesta entre todas las partes implicadas con el fin de determinar con precisión las exigencias de la organización de compras. En una primera encuesta se pretendía descubrir exactamente lo que la organización de compras hacía de manera regular, por lo que se distribuyó entre todos los representantes de compras de la compañía. Una segunda encuesta estaba dirigida a las partes implicadas más importantes, como los departamentos de Cuentas de Acreedores Comerciales, de Recursos Humanos y de Logística, que mantenían relaciones continuas con el área de Compras. A pesar de que sólo había unas doscientas personas trabajando en la organización de compras, eran más de dos mil los empleados que generaban solicitudes de pedidos de compra.

Los resultados de las encuestas fueron aleccionadores e hicieron reflexionar a sus responsables (véase el **Anexo 5**). Al contrario del objetivo fijado en la Estrategia de Gestión de Suministros de que los empleados dedicasen al menos el setenta por ciento de su tiempo a actividades de gestión de proveedores[10], los resultados de las encuestas pusieron de manifiesto que una muy elevada proporción (el 85 por ciento) de su tiempo estaba dedicado a la realización de actividades no estratégicas como, por ejemplo, la revisión de las existencias, la aceleración de los procesos y la recogida de datos. Braunschweig describía la situación de la manera siguiente: "[la encuesta] se convirtió en el caballo de batalla de los promotores del equipo de trabajo. Además, el Grupo de Unidad de Compras se quedo atónito".

La determinación de los procesos "futuros" de compras

Casi a finales del mes de marzo de 1998, el equipo de proyecto empezó a elaborar el proceso "futuro" que representaba la visión deseada de la organización de compras en Harley-

[10] Se consideraba que en las actividades de gestión de suministradores estratégicos de Harley estaban incluidas medidas relativas al desarrollo de las relaciones con los proveedores, a la gestión de las actuaciones de los proveedores y a la mejora de la calidad, de los costes y de los plazos.

Davidson. Muy poco tiempo después, el equipo llegó a la conclusión de que la participación a tiempo parcial no era la más adecuada. Los miembros del equipo decidieron entonces solicitar recursos a tiempo completo que estuvieran autorizados por el resto del equipo para definir los procesos futuros.

A principios del mes de abril, David Cotteleer fue a ver al Grupo de Unidad de Compras con una recomendación hecha por las divisiones de Equipamientos Originales, de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones y de Desarrollo de Productos. Una vez más, el apoyo de Garry Berryman fue fundamental para poder acceder a las personas clave. De esa forma, un reducido núcleo del equipo siguió trabajando a tiempo completo mientras que los miembros del grupo original permanecían ligeramente conectados al proyecto a través de videoconferencias y de reuniones ocasionales. A los efectos del proyecto, "a tiempo completo" quería decir de martes a jueves (los lunes y los viernes los tres miembros del equipo de compras volvían sus organizaciones o centros respectivos). Cotteleer explicaba así la importancia de mantener a esos miembros del equipo vinculados a sus organizaciones:

> Si obligásemos a que esas tres personas trabajasen todo el tiempo para nosotros, empezarían a desconectarse de lo que sucede en el trabajo real diario. No queríamos que pasara eso, ya que sabíamos que iba a ser un proyecto a largo plazo. Éramos conscientes de que debíamos seguir manteniendo el contacto con los centros de producción, de manera que no acabáramos creando algo que cumpliera requisitos que habían dejado ya de ser válidos.

A pesar de las exigencias de la dirección por obtener resultados concretos del trabajo del equipo, David Cotteleer estaba decidido a ser sistemático en cuanto a la determinación de procesos, de forma que pudiera asegurar una correcta selección de software y una implementación sin riesgos de los sistemas informáticos. En el mes de mayo de 1998, tras haber determinado los procesos existentes en toda la empresa y después de realizado las encuestas entre las partes implicadas, el equipo central del proyecto empezó a perfeccionar el proceso "futuro" y a determinar los requisitos de los nuevos sistemas informáticos de compras de Harley-Davidson.

Personal, procesos y nuevas tecnologías

Al igual que en otros proyectos de sistemas, el equipo del proyecto SiL'K utilizaba el modelo de Integración de Negocios de Harley-Davidson, que hacía especial hincapié en el personal, los procesos y las nuevas tecnologías a la hora de estudiar las iniciativas para el cambio. En el caso de la Estrategia de Gestión de Suministros (SMS), el elemento "personal" se había reestructurado y pasado de corresponder a una organización descentralizada a otra de carácter híbrido[11], además se había creado un grupo de responsables de compras con el fin de que redefinieran funciones y responsabilidades. Las decisiones relativas a "nuevas tecnologías" habían sido transferidas al grupo de Integración de Arquitecturas (AI, según sus siglas en inglés) de Harley[12]. Se hizo entonces responsable a este grupo de garantizar que las soluciones técnicas definidas por el equipo del proyecto SiL'K fueran compatibles con la arquitectura de los sistemas de información existentes en la empresa. A raíz de esa decisión, el equipo SiL'K se concentró en el elemento "procesos" del proyecto.

---

[11] La organización de Harley-Davidson no está completamente centralizada ni totalmente descentralizada. Parte de sus actividades y del proceso de toma de decisiones tiene lugar en el ámbito corporativo o central (por ejemplo, toda la actividad de desarrollo de productos), mientras que otra parte de sus actividades se realiza en el ámbito de la explotación o de los centros de producción (por ejemplo, el soporte dado a las operaciones regulares).

[12] El grupo AI es responsable de definir la dirección estratégica en materia de tecnologías de la información en Harley-Davidson. Este grupo establece las normas aplicables a la configuración del hardware y del software.

Una de las etapas más importantes de la primera parte del desarrollo de los procesos fue la definición del ámbito del proyecto. El flujo de procesos "reales" elaborado por el equipo del proyecto SiL'K había permitido determinar una serie de interrelaciones con otras áreas. Al considerar el desarrollo de productos como una progresión hecha a partir de una idea hasta la obsolescencia, el equipo pudo identificar diversas actividades de carácter general en las que participaba el área de Compras. Cada una de esas actividades se dividía a su vez en subactividades, con grupos asociados de partes implicadas (p. ej., compras, ingeniería, fabricación, finanzas, proveedores). Una vez determinadas las partes implicadas, el equipo pudo decidir si el área de Compras debería ser titular y directora de una actividad, o simplemente participante en ella (véase el **Anexo 6a**). A continuación, el equipo de trabajo agrupó las actividades del proyecto en tres fases distintas de implementación (véase el **Anexo 6b**).

A lo largo de todo ese proceso, el equipo se concentró en la gestión de las expectativas. Había bastante comunicación entre el equipo y el público objetivo de la empresa, formado por unas ochocientas personas (doscientas en el área de abastecimientos y seiscientas en departamentos asociados a ella). Las actualizaciones de información realizadas por el equipo con respecto a la situación del proyecto se efectuaban en todos los centros de producción con periodicidad trimestral. David Cotteleer presentaba un informe de situación todos los meses al Grupo de Unidad de Compras y cada tres meses al Consejo Asesor de Suministradores de Harley-Davidson[13]. Julie Anding, la representante en el equipo del departamento de Gestión del Cambio, era responsable de elaborar boletines informativos periódicos acerca del proyecto en los que se informaba a toda la empresa de sus objetivos, actividades y progresos logrados.

La visión común del equipo de trabajo con respecto a los nuevos procesos y actividades simplificaba la labor de elaborar una especificación funcional conjunta por escrito o, lo que es lo mismo, una solicitud de ofertas. El 30 de septiembre de 1998, se distribuyó un borrador de solicitud de ofertas a toda la organización de Compras con el fin de todas las partes implicadas de la empresa pudieran examinarlo y dar su opinión sobre la propuesta. La aceptación y validación interna de la solicitud de ofertas fue inmediata y positiva. A partir de entonces, se aceleró notablemente el proceso de selección del suministrador (véase el **Anexo 7**).

La selección del suministrador

El 16 de octubre de 1998, la solicitud de ofertas para los nuevos sistemas que deberían dar soporte a la Estrategia de Gestión de Suministros (SMS) se presentó a varios proveedores potenciales seleccionados previamente. La determinación de los candidatos había comenzado unos meses antes, en el momento en que David Cotteleer envió un documento en el que describía los objetivos de la SMS de Harley-Davidson a una empresa de estudios del sector de bastante renombre, pidiéndole consejo acerca de posibles proveedores de software. A los seis nombres que la empresa consultora ofreció a Harley-Davidson, ésta añadió varios más derivados de sus propios conocimientos (esto es, la utilización de productos de proveedores potenciales en Harley-Davidson) y de otras informaciones adicionales a las que el equipo del proyecto tuvo acceso. A continuación, se pidió a los suministradores potenciales que notificasen a Harley-Davidson su intención de presentarse al concurso antes del día 25 de octubre.

La reunión general de suministradores

Creo que sorprendimos a muchas de las personas que estaban en esa sala. Allí estábamos nosotros, un puñado de representantes del área de Compras, un jefe de proyecto, una representante de Gestión del Cambio y otro representante de Reingeniería de Procesos; no había ningún directivo en la sala, ni tampoco

[13] En el Consejo Asesor de Suministradores están incluidos dieciséis de los proveedores estratégicos de Harley que se reúnen cada tres meses con el fin de debatir cuestiones relacionadas con la gestión de suministros.

personas responsables de tomar decisiones importantes. Seguro que pensaron, ¡vaya equipo de operarios con el que tenemos que negociar y que después decidirá qué software prefiere! Estoy segura que no se esperaban nada parecido.

— Julie Anding

La reunión general de suministradores supuso el primer encuentro de éstos con el equipo de proyecto que se encargaría de tomar la decisión final respecto a la elección del mejor proveedor. Pat Davidson abrió la sesión exponiendo las características de la organización de compras de Harley-Davidson. Check Carter, uno de los encargados de compras de más rango de la división de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones, fue el siguiente en hacer una declaración convincente de los valores de Harley-Davidson y de las expectativas del proceso por parte del equipo. Carter hizo hincapié en que para Harley-Davidson esos valores eran sagrados (véase el **Anexo 8**). Uno de los representantes de los suministradores hablaba así de sus propias impresiones personales:

Lo que Carter contó me pareció sorprendente. Dijo: "Vendemos una imagen muy concreta y también vendemos diversión. Nuestros productos son geniales. Lo que ustedes venden son cosas aburridas. Es cierto que se trata de bits y de bytes, pero esas cosas no pasan de ser un mal necesario. Lamento decirles eso, pero creo que es la auténtica verdad". En cuanto a lo que nos dijeron respecto a sus valores, estaba muy claro que ésa era su cultura, su empresa, y que andaban buscando socios que fueran flexibles y supieran adaptarse precisamente a esa cultura.

A continuación, David Cotteleer explicó la relación existente entre la Estrategia de Gestión de Suministros, las exigencias operativas y las capacidades existentes (véase el **Anexo 9**) y puso énfasis en las "reglas básicas" de Harley-Davidson con respecto a ese proceso. El equipo del proyecto SiL'K fue muy claro en cuanto a que no estaba buscando una solución completa de planificación de recursos empresariales (ERP, según sus siglas en inglés)[14], que su ámbito estaba muy bien delimitado y que los proveedores no deberían perder el tiempo buscando funcionalidades adicionales. Cotteleer habló también de la importancia de una responsabilidad doble, y añadió que "esperamos que nos hagan también responsables de esto, por lo que si alguna vez piensan que no nos comportamos como debemos, tendrán que frenar nuestras acciones".

El mismo representante de los suministradores dijo después del encuentro: "Salimos de la sala muy seguros de que habíamos estado con una empresa que sabía muy bien lo que se traía entre manos y que ya contaba con su propio sistema en marcha. También sabíamos que el equipo de proyecto era quien iba a tomar la decisión final".

Propuestas y presentaciones

Cada uno de los ocho proveedores participantes presentó una respuesta a la solicitud de ofertas, así como una lista de control integral de autoevaluación. El equipo de proyecto utilizó la lista de control como medida de evaluación cuantitativa de la adecuación inicial de funcionalidades (véase el **Anexo 10**). A partir de esa lista de control de funcionalidades, pudieron distinguirse inmediatamente dos grupos de proveedores diferentes: aquéllos que se daban a sí mismos una adecuación superior al noventa por ciento y aquellos otros que se puntuaban por debajo del noventa por ciento en cuanto a su adaptación a las funcionalidades requeridas.

[14] Los sistemas de "Planificación de recursos empresariales" (ERP) son un tipo de paquetes informáticos que pretenden integrar casi todas las funciones internas de la organización. Véase la nota tecnológica de la Harvard Business School (HBS) número 699-020 titulada *Enterprise Resource Planning (ERP)* para más información sobre esas clases de paquetes de software.

A pesar de que el grupo de proyecto tenía previsto asignar la responsabilidad de revisar las propuestas a grupos de dos personas pertenecientes al equipo, al final hubo tiempo suficiente para que todo el mundo pudiera revisar individualmente cada una de las propuestas presentadas. Las dudas y cuestiones que surgieron después se presentaron a diversos equipos de la compañía antes de celebrar una reunión de presentación de tres horas de duración de cada una de las propuestas por los propios proveedores. Con el fin de ayudar al proceso de evaluación, el equipo de proyecto elaboró un folleto en el que se documentaba la propuesta de cada suministrador para cada uno de los apartados de la especificación, se detallaban sus respectivas fortalezas y debilidades y se verificaba el cumplimiento de los requisitos más importantes.

Además del equipo del proyecto SiL'K, a las reuniones de presentación de los suministradores también asistieron especialistas informáticos como Tom Cullen, director de Sistemas del Grupo de Fabricación, y Karen Kaminski, directora de Integración de Arquitecturas. Su cometido era analizar los requisitos de arquitectura de cada uno de los paquetes informáticos y determinar los posibles problemas de interconexión con los sistemas de Harley-Davidson ya en funcionamiento y con las iniciativas en materia de tecnologías de la información que se estaban poniendo en marcha. En total, se hicieron siete presentaciones en el plazo de una semana[15]. A continuación, el equipo de proyecto se puso a trabajar de firme con el fin de valorar minuciosamente lo que habían visto y leído, así como de eliminar aquellas propuestas candidatas que no se adecuaran a lo buscado.

Reducción de las opciones

No dijimos en absoluto que cada uno debía votar por las tres mejores opciones y así elegiríamos después, a pesar de que a algunos les hubiera gustado que aplicáramos ese método. Yo quería asegurarme de que nos estábamos centrando exclusivamente en el proceso y en las funcionalidades, así como en los pros y los contras. Por lo tanto, nos pusimos a analizar cada una de las compañías candidatas y elaboramos una lista con sus ventajas e inconvenientes respectivos.

— David Cotteleer

Con el propósito de reducir el número de suministradores posibles, el equipo de proyecto evaluó cada una de las propuestas escritas, de las presentaciones y de las notas correspondientes a todos los candidatos. Los proveedores que se habían autocalificado en menos de un noventa por ciento en cuanto a su capacidad para cumplir las especificaciones marcadas (a ese respecto, cabe señalar que tres de ellos se encontraban en torno al setenta por ciento) se consideraron candidatos no idóneos. Sin embargo, las presentaciones dieron más de una sorpresa al equipo evaluador. Uno de los proveedores, poseedor de una "gran funcionalidad", fue eliminado del concurso debido a su incompatibilidad arquitectónica con las normas actuales y previstas de infraestructura de Harley-Davidson. Otro suministrador, especializado en sistemas informáticos para el área de compras, encantó al equipo de proyecto con su "bonito paquete informático". No obstante, esa empresa fue eliminada al final, después de hacer una evaluación objetiva de su pequeño tamaño y de su capacidad potencial para satisfacer las necesidades futuras de soporte. El equipo de proyecto decidió deliberadamente concentrarse en los aspectos relacionados con la funcionalidad y evitar la consideración de los factores económicos (costes) en esa etapa del proceso. Después de muchos y largos debates, el equipo eligió por unanimidad a los tres finalistas.

El paso siguiente consistía en organizar visitas a los centros e instalaciones de los tres suministradores preseleccionados, donde deberían realizar nuevas demostraciones de sus paquetes de software respectivos. Para esa fase, el equipo del proyecto SiL'K elaboró diez escenarios posibles, basados en los requisitos tecnológicos y del proceso derivados de la

[15] Tras la reunión general inicial, dos suministradores decidieron no presentar propuestas para el concurso final y otro de los aspirantes se retiró del proceso después de presentada su oferta.

especificación funcional, que los proveedores utilizaron para demostrar sus productos. Durante el mes de enero de 1999, se dedicaron dos días completos a cada uno de los tres finalistas con el ánimo de conocer más a fondo tanto el paquete informático propuesto como la propia organización de la empresa. Una vez más, el equipo al completo del proyecto SiL'K fue a esas visitas, y posteriormente utilizó tanto métodos cuantitativos como cualitativos para evaluar las soluciones propuestas por los proveedores finalistas (véanse en el **Anexo 10** los criterios de decisión y las evaluaciones realizadas, y en el **Anexo 11** algunas de las opiniones de los componentes del equipo de proyecto).

Los tres contendientes finales

Proveedor núm. 1

Desde el inicio del proceso, el Proveedor número 1 se distinguió claramente de los demás. Sus representantes hicieron las preguntas más pertinentes, aceptaron sin equívocos los valores de Harley-Davidson y parecieron muy dispuestos a aceptar el estilo informal, pero competente, de Harley. La propuesta escrita presentada por los miembros del equipo del Proveedor número 1 estaba perfectamente adaptada a las exigencias indicadas en la solicitud original de ofertas de Harley-Davidson, y respondía claramente a cada una de las cuestiones planteadas por el equipo del proyecto SiL'K. En la lista de control de autoevaluación, el Proveedor número 1 obtenía una puntuación del 93,4 por ciento. Durante la presentación inicial, el equipo del proyecto SiL'K sintió una gran afinidad natural con sus representantes, ya que parecían tener una cultura empresarial similar a la suya. Sin lugar a dudas, en la reunión general de suministradores habían destacado enormemente ya que, aparte de todo lo demás, los representantes del Proveedor número 1 llevaban puesta ropa de la marca Harley-Davidson. Durante las visitas realizadas a esa empresa durante el mes de enero, el equipo del proyecto SiL'K se sintió enormemente a gusto con todos los empleados del Proveedor número 1 que le atendieron y que quizás se convertirían en sus colaboradores futuros.

En lo que se refiere a la funcionalidad, el Proveedor número 1 no era el mejor de todos, a pesar de que ninguno de los tres finalistas había ofrecido una adecuación perfecta a las especificaciones requeridas. Su paquete de software no ofrecía directamente "capacitación para trabajar en Internet", pero sus especialistas proponían integrar una solución complementaria para conseguirlo. En lo que respecta a los aspectos relacionados con la organización, sin embargo, el Proveedor número 1 era muy conocedor de los asuntos relacionados con la gestión del cambio, por lo que los procesos de formación y de gestión del cambio formaban parte integral de su metodología de puesta en funcionamiento del programa.

Proveedor núm. 2

El Proveedor número 2 fue también uno de los más destacados desde el inicio del proceso de selección. Se trataba de un importante suministrador de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) que contaba con gran prestigio en el sector, a pesar de que sus productos solían ser más caros que los de sus competidores. Los documentos de la propuesta presentados al equipo del proyecto SiL'K eran muy completos y este proveedor había conseguido la calificación más alta en la lista de control de funcionalidades cuantitativas (exactamente el 98,7 por ciento). Los representantes del Proveedor número 2 eran auténticos profesionales, aunque quizás un poco más formales de los que Harley-Davidson estaba acostumbrada a tratar. La presentación que realizaron fue también impecable y exhaustiva.

La visita hecha a esa empresa y las demostraciones que allí se realizaron sirvieron para confirmar la funcionalidad superior del Proveedor número 2, en la que se incluía un interface avanzado que capacitaba para trabajar en Internet. A pesar de que el equipo de trabajo del

suministrador ofreció un paquete informático con documentación escrita para cursos de formación, no hicieron hincapié en los métodos ni en los procesos destinados a evaluar las necesidades organizativas y a preparar a los empleados para el cambio. Además, algunos miembros del equipo del proyecto SiL'K estaban un poco molestos por la evidente actitud de "consultores" que habían adoptado los representantes del Proveedor número 2.

Proveedor núm. 3

El Proveedor número 3 era uno de los más importantes del segmento de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y hacía poco tiempo que la propia Harley-Davidson lo había contratado para instalar sistemas informáticos en un área funcional diferente de la empresa. En un principio, esa compañía no se había destacado como una de las mejores. La propuesta de software que hizo fue considerada en general como "una historia ya conocida" y algunos incluso se preguntaban si este candidato se había leído el documento de solicitud de ofertas enviado por Harley-Davidson. La presentación inicial fue un auténtico desastre. Los representantes del suministrador llegaron tarde a la reunión, no se habían siquiera reunido con algún representante de la compañía con el que fueran a colaborar en el futuro, emplearon más tiempo del previsto para realizar su presentación, y no demostraron mucha funcionalidad. El equipo de Harley-Davidson se sintió además muy molesto por la condescendencia mostrada por los representantes del proveedor. Sin embargo, la puntuación obtenida por el Proveedor número 3 en la lista de control de autoevaluación de las funcionalidades fue muy alta (96,8 por ciento), por lo que el equipo de proyecto tuvo que admitir que no podía eliminar de un plumazo a ese candidato. Después de mucho debatir sobre ello, el equipo acordó conceder al Proveedor número 3 dos horas más para presentar nuevos argumentos. En la siguiente presentación se confirmaron de verdad todas las posibilidades funcionales del paquete de software ofrecido por el Proveedor número 3.

De manera análoga, la visita hecha a la compañía durante el mes de enero puso de manifiesto la sólida funcionalidad ofrecida, pero también reveló que dedicaba mucha menos atención a las cuestiones de carácter personal. El equipo de trabajo mostró muchas dudas al respecto, pero no se atrevió a pasar por alto las grandes ventajas políticas y económicas que se lograrían en el futuro en caso de trabajar con el Proveedor número 3.

El momento de la decisión final

El equipo del proyecto SiL'K había intentado tener en cuenta en su decisión final a todos los factores que podrían influir de manera importante en el éxito definitivo de la implementación del proyecto de software de gestión del proceso de compras. Algunos de los componentes del equipo tenían las ideas muy claras en cuanto a la importancia relativa de los diferentes planteamientos:

Braunschweig: "Pienso que la funcionalidad es el elemento clave que andamos buscando. Incluso si surgieran conflictos personales, creo que podríamos superarlos. Los tres proveedores candidatos cuentan con la arquitectura informática necesaria. Los costes tienen que tenerse en cuenta posteriormente. Espero realmente que la funcionalidad sea lo más importante que consigamos del proyecto, debido a que eso es lo que los empleados van a ver, lo que van a utilizar diariamente en su trabajo. Y eso es lo que les va a causar molestias o incomodidades".

Jarosz: "Si todo lo que yo tuviera que hacer es decir, "Usuario final, aquí tienes tu funcionalidad", sería tonto si no eligiera al Proveedor número 2. Sin embargo, me preocupa mucho que el cambio que los empleados tienen que hacer sea diez veces más difícil que la puesta en funcionamiento del software. Uno puede quedarse con un producto de mala calidad pero, si cuentas con el apoyo de los empleados, es posible salir adelante; mientras que uno puede comprar un producto que sea maravilloso pero, si todo el mundo lo rechaza, el fracaso estará asegurado. Por lo tanto,

necesitamos pensar seriamente en todo este asunto de la gestión del cambio y de la implementación del nuevo sistema informático".

Anding: "Necesitamos hacer las cosas bien, debemos elegir el software que sea más indicado para darnos de verdad la funcionalidad máxima que necesita el área de Compras, y que también precisa la estrategia y la dirección que queremos que guíen el futuro de la empresa. Creo que el equipo de proyecto es plenamente consciente de todo eso".

Pues: "A las personas les gusta hacer negocios con personas que les caigan bien. Por ello, debemos aplicarse ese enfoque a las organizaciones que estamos estudiando: Proveedor número 1, Proveedor número 2 y Proveedor número 3. Debemos conocer bien las características personales de sus organizaciones e intentar comprender mejor el soporte con el que cuentan. Ello se debe a que la implementación del proyecto determina el momento en el que comienza el trabajo de verdad, por lo cual es necesario que trabajemos con personas con las que nos sintamos cómodos".

Cotteleer: "Harley-Davidson es un empresa que valora mucho las relaciones personales. Ahora estamos buscando socios. Sin embargo, al mismo tiempo queremos de verdad elegir el mejor producto para nuestros procesos. Si fuera menester, podríamos adaptarnos a personas que no nos caen del todo bien para llevar a buen término la implementación del sistema … Ése no es un problema tan insalvable como los riesgos de mala implementación derivados de una funcionalidad deficiente".

En el momento en que los componentes del equipo del proyecto SiL'K tomaron asiento alrededor de la mesa, todos echaron una ojeada en torno a la sala de juntas para comprobar el enorme volumen de información que habían recopilado. El proceso había sido largo y la decisión respecto a un suministrador y socio todavía no estaba clara. David Cotteleer se preguntaba entonces si el enfoque aplicado por Harley-Davidson de asociar el proceso de selección del nuevo software con la estrategia global de gestión de suministros había sido lo más acertado. También se preguntaba si todos los pasos que habían dado durante el proceso de selección servirían para añadir valor a su decisión. Por último, se preguntaba cómo debería el equipo de trabajo determinar el equilibrio entre las diversas fortalezas y debilidades de cada uno de los suministradores candidatos en el momento de hacer la elección final. Mientras todas esas cuestiones y muchas otras más seguían dando vueltas en su cabeza, Cotteleer se dirigió al grupo y optó por abrir el debate.

Anexo 1 Información financiera más importante de Harley-Davidson[16]

	1998	1997	1996	1995	1994
Ingresos:	**2.063.956 $**	**1.762.569 $**	**1.531.227 $**	**1.350.466 $**	**1.158.887 $**
Motocicletas Harley-Davidson	1.595.415 $	1.382.809 $	1.199.163 $	1.038.335 $	890.578 $
Piezas y accesorios	297.140 $	241.940 $	210.229 $	192.093 $	161.928 $
Artículos varios	114.484 $	95.055 $	90.713 $	100.248 $	94.383 $
Motocicletas Buell	53.527 $	40.305 $	24.380 $	14.154 $	5.791 $
Defensa y otros sectores	3.390 $	2.460 $	6.742 $	5.636 $	6.207 $
Ventas nacionales como porcentaje de los ingresos	75,9 %	74,0 %	72,5 %	70,3 %	71,4 %
Ventas internacionales como porcentaje de los ingresos	24,1 %	26,0 %	27,5 %	29,7 %	28,6 %
Margen bruto:	**690.670 $**	**586.217 $**	**490.094 $**	**411.399 $**	**358.339 $**
Gastos de explotación (motocicletas)	366.222 $	320.731 $	262.001 $	226.923 $	194.829 $
Gastos de explotación (corporativos)	11.043 $	7.838 $	7.448 $	7.300 $	9.948 $
Resultados de Eaglemark[17]	20.211 $	12.355 $	7.801 $	3.620 $	--
Resultado antes de impuestos	336.229 $	276.302 $	227.622 $	175.989 $	156.440 $
Resultado neto:	**213.500 $**	**174.070 $**	**166.028 $**	**112.480 $**	**104.272 $**
Beneficio por acción ordinaria:					
Básico	1,40 $	1,15 $	1,10 $	0,75 $	0,69 $
Reajustado	1,38 $	1,13 $	1,09 $	0,74 $	0,68 $
Media ponderada de acciones ordinarias:					
Básica	152.227	151.650	150.683	149.972	150.440
Reajustada	154.703	153.948	152.925	151.900	153.365
Dividendos por acción	0,155 $	0,135 $	0,11 $	0,09 $	0,07 $
Cotización de cierre de las acciones	47,38 $	27,25 $	23,50 $	14,38 $	14,00 $
Caja y equivalentes en efectivo	165.170 $	147.462 $	142.479 $	31.462 $	57.884 $
Activo circulante total	844.963 $	704.021 $	613.129 $	331.983 $	334.127 $
Activo total	**1.920.209 $**	**1.598.901 $**	**1.299.985 $**	**1.000.670 $**	**676.663 $**
Pasivo circulante total	468.515 $	361.688 $	251.098 $	233.210 $	154.769 $
Endeudamiento financiero	280.000 $	280.000 $	250.000 $	164.330 $	--
Otro pasivo	141.783 $	130.545 $	136.167 $	108.561 $	88.662 $
Pasivo total	**890.298 $**	**772.233 $**	**637.265 $**	**506.101 $**	**243.431 $**
Recursos propios totales	**1.029.911 $**	**826.668 $**	**662.720 $**	**494.569 $**	**433.232 $**


[16] Todas las cantidades están expresadas en miles, excepto los importes por acción y el precio de las acciones.

[17] Eaglemark Financial Services, Inc. es una filial de Harley-Davidson que ofrece financiación, seguros y programas de tarjetas de crédito al por mayor y al por menor a los concesionarios y los clientes de Harley.

Anexo 2a Centros de producción y Divisiones de la empresa

CENTROS DE PRODUCCIÓN	DIVISIONES DE LA EMPRESA
Wisconsin:	
Milwaukee	Sede central de la compañía
	Piezas y accesorios
	Artículos varios
	Ventas
	Investigación y desarrollo
Wauwatosa	Centro de desarrollo de productos
	Producción de sistemas de transmisión y motores XL
Menomonee Falls	Producción de sistemas de transmisión y motores FL
Franklin	Centro de distribución de piezas y accesorios
Tomahawk	Producción y pintura de piezas de fibra de vidrio
Pennsylvania:	
York	Producción de piezas
	Pintura
	Ensamblaje final de motocicletas (motocicletas de encargo y del modelo "Touring")
Missouri:	
Kansas City	Producción de piezas
	Pintura
	Ensamblaje final de motocicletas (motocicletas del modelo "Sporster")

Anexo 2b Círculos de dirección

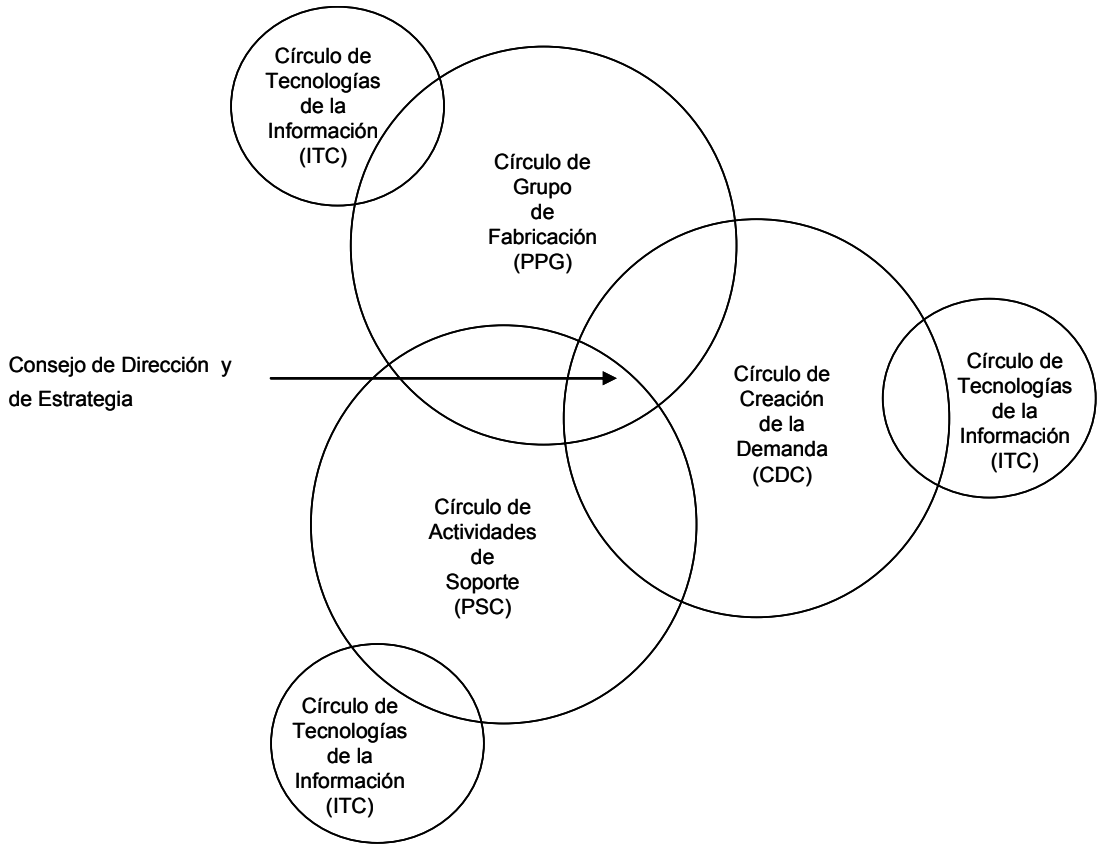

Anexo 3 Beneficios previstos derivados del proyecto SiL'K

Personal: Cambios en las conductas que afectan a la manera en que se realiza el trabajo eficientemente

- Reducción del tiempo dedicado por el personal a tareas no estratégicas
- Corrección y solución de errores
- Eliminación de registros duplicados de datos
- Aumento de las actividades de abastecimiento estratégico
- Desarrollo de proveedores
- Aprovisionamiento estratégico

Procesos: Cambios en los métodos utilizados para realizar el trabajo eficientemente

- Disminución de la complejidad gracias a un proceso uniforme de abastecimiento en todos los centros de producción
- Capacitación para la aplicación de la estrategia de la división de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones (MRO)
- Reducción del ciclo temporal de las compras
- Reducción de las actividades manuales
- Reducción de los errores en la base de aprovisionamientos causados por procesos específicos de los centros de producción
- Aumento de la integración de los proveedores en el proceso de abastecimiento
- Logro de los objetivos en materia de calidad, costes y plazos (QCT, según sus siglas en inglés) para compras relacionadas con el lanzamiento de nuevos productos

Nuevas tecnologías: Cambios en las herramientas empleadas para hacer el trabajo eficientemente

- Disminución de la complejidad gracias a herramientas y sistemas comunes
- Reducción del mantenimiento del sistema y de los costes de obsolescencia
- Consolidación de datos para la toma de decisiones
- Visión empresarial de la actividad y los resultados de la base de aprovisionamientos
- Agrupación empresarial de la demanda para sacar el máximo partido de los proveedores y los contratos (entre centros de producción y divisiones de negocio)
- Mejora del acceso de los proveedores a la calidad, los costes y los plazos y a los datos de demanda

Todos los beneficios que se acaban de detallar tienen un efecto directo en la relación existente entre Harley-Davidson y sus suministradores.

Los datos sobre mejores prácticas de implementaciones similares demuestran que esos beneficios se manifiestan de las maneras siguientes:

1. Reducción de costes importantes debido a la disminución de los costes laborales y de la cadena de suministros.
2. Reducción de los costes de inventario debido a una demanda más fácilmente previsible y a una mejor visibilidad en la cadena de suministros.
3. Reducción de los costes de mantenimiento debido a la existencia de un inventario menor en las plantas de fabricación de Harley-Davidson.

Fuente: Documento interno de Harley-Davidson.

Anexo 4 Composición del equipo de trabajo del proyecto SiL'K y características profesionales de los miembros del equipo

Promotores:

- Garry Berryman (Compras) – Vicepresidente de Gestión de Materiales
- Dave Storm (Sistemas de Información) – Vicepresidente de Planificación y Servicios de Información

Comité de Dirección:


- Garry Berryman (Compras) – Vicepresidente de Gestión de Materiales
- Dave Storm (Sistemas de Información) – Vicepresidente de Planificación y Servicios de Información
- Tom Cullen (Sistemas de Información) – Director de Sistemas - Grupo de Fabricación
- Pat Davidson (Compras) – Directora – Planificación y Control de Compras
- Cory Mason (Sistemas de Información) – dirección general de Informática del Grupo de Fabricación

Equipo del proyecto:

- Julie Anding (Sistemas de Información) – Representante del área de Gestión del Cambio
- Chuck Braunschweig (Innovación de Procesos) – Representante del área de Innovación de Procesos
- Chuck Carter (Compras / Centro de Desarrollo de Productos) – Representante del área de Compras para el desarrollo de productos con experiencia como encargado de compras de alto nivel de la división de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones en la organización del tren de fuerza (*Powertrain*) y, con anterioridad, miembro del Círculo de Mejores Prácticas de la división de Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones
- Glenn Christianson (Compras / Tomahawk) – Director de Materiales en Tomahawk con más de treinta años de experiencia en Harley-Davidson
- Dave Cotteleer (Sistemas de Información) – Director del proyecto
- Eric Doman (Compras / Artículos Varios) – Representante del área de Compras para Artículos Varios
- Eileen Jarosz (Compras / Centro de Desarrollo de Productos) – Técnico de Compras para desarrollo de productos con varios años de experiencia como encargado de compras de Equipamientos Originales en York
- Maxine Peissig (Compras / Organización del Tren de Fuerza) – Representante del área de Compras de la organización del Tren de Fuerza (*Powertrain*)
- Rick Pues (Compras / Kansas City) – Director de Procesos de Planificación y Control de Compras y también representante del centro de producción de Kansas City


- Kerry Sarder (Compras / Piezas y Accesorios) – Encargado de compras de alto nivel y representante del área de Compras de la división de Piezas y Accesorios
- Bob Walker (Compras / York) – Representante del área de Compras del centro de producción de York, con más de veinte años de experiencia en gestión de materiales en Harley-Davidson
- Blaine Webster (Sistemas de Información) – Analista de sistemas

Anexo 5 Distribución del tiempo de trabajo de los especialistas dedicados a compras y materiales por ramas de actividad

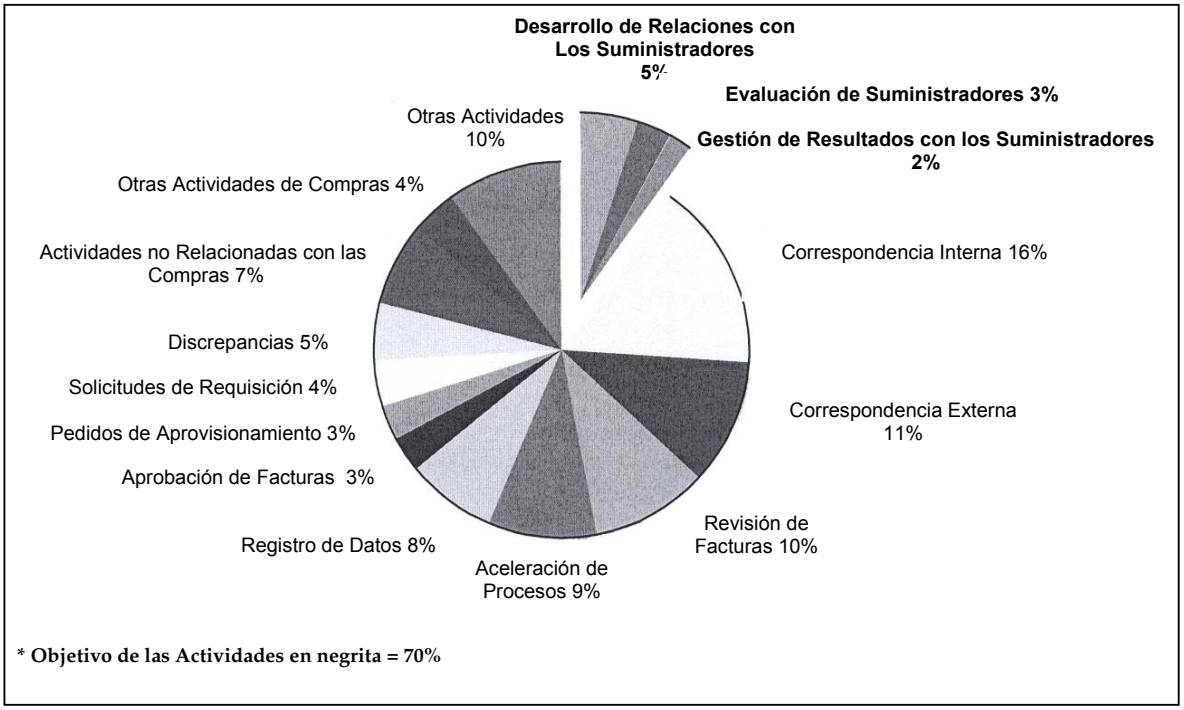

Fuente: Documento interno de Harley-Davidson.

Anexo 6a Ámbito del proyecto SiL'K

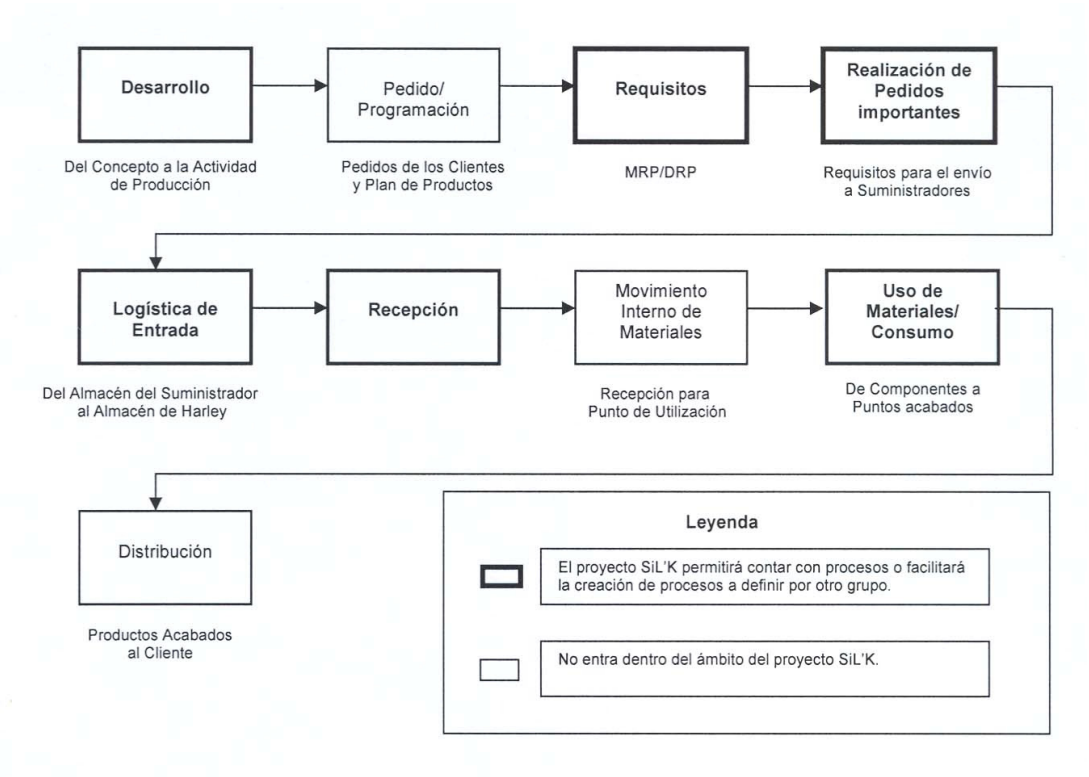

Anexo 6b Fases de puesta en funcionamiento del proyecto SiL'K

Fase 1: Procesos y sistemas de transacciones. Se trata de los procesos y los sistemas utilizados para dar soporte a la ejecución de actividades fundamentales del área de Compras, entre las que se incluyen las siguientes:

a) Requisitos / Requisiciones / Plazos
b) Creación de documentos de compra (elaboración de pedidos)
c) Recibos / Seguimiento
d) Procesado de facturas

Fase 2: Procesos y sistemas de información sobre suministradores. Se trata de los procesos y los sistemas utilizados para gestionar las relaciones y el intercambio de información a través de la red Internet de Suministros, entre las que se incluyen las siguientes:

a) Información sobre los resultados de los suministradores
b) Comunicación e integración de suministradores
c) Gestión de los contactos con los suministradores

Fase 3: Procesos y sistemas de seguimiento de proyectos. Se trata de los procesos y los sistemas que dan soporte a las actividades del área de Compras relacionadas con:

a) La metodología de productos coincidentes y de elaboración de procesos
b) La planificación de productos
c) La asignación de recursos
d) La determinación de costes objetivo
e) La preparación para la creación y el lanzamiento

Fuente: Documento interno de Harley-Davidson.


Anexo 7 Resumen de las actividades y de los momentos más importantes del proyecto SiL'K

Enero de 1997	Se inicia el lanzamiento de la Estrategia de Gestión de Suministros
Julio de 1997	Reunión inicial de planificación del proyecto SiL'K en el restaurante McDonald's
Octubre de 1997	Presentación del valor al Grupo de Dirección de Compras
Otoño de 1997	Sesión de intercambio de puntos de vista (*brainstorming*) a la que se llamó "Seamos valientes"
Noviembre de 1997	Asignación de recursos del área de Compras para formar el equipo del proyecto SiL'K
Noviembre de 1997 – Marzo de 1998	Determinación del proceso "real" de compras. Identificación de las características comunes entre los distintos centros de producción
Abril de 1998 – Septiembre de 1998	Desarrollo de procesos "futuros". Participación del equipo de sistemas
Mayo de 1998 (todavía en curso)	Comunicación sobre gestión del cambio a todas las partes interesadas
30 de septiembre de 1998	Elaboración final de la especificación funcional (solicitud de ofertas). Distribución a las partes interesadas internas para su revisión.
9 de octubre de 1998	Recepción de comentarios hechos por las partes interesadas internas
16 de octubre de 1998	Distribución de las solicitudes de ofertas e invitación a presentar propuestas al conjunto seleccionado de proveedores de software
25 de octubre de 1998	Los proveedores de software confirman su intención de participar en el concurso de ofertas
5 de noviembre de 1998	Reunión general de suministradores de software
16 de noviembre de 1998	Presentación de propuestas de posibles proveedores de software
1 al 4 de diciembre de 1998	Presentación formal de propuestas a Harley-Davidson
7 al 11 de diciembre de 1998	Revisión de propuestas y presentaciones
11 de diciembre de 1998	Preselección de tres posibles suministradores
10 al 22 de enero de 1999	Presentaciones de dos días de duración y demostraciones preparadas de antemano en las instalaciones de los proveedores preseleccionados, y verificaciones de referencia con clientes ya incorporados al sistema
30 de enero de 1999	Selección entre los finalistas

Anexo 8 Valores empresariales y asuntos económicos más

Valores empresariales:	**Asuntos económicos más importantes:**
Decir siempre la verdad	Calidad
Ser justos	Participación
Cumplir las promesas hechas	Productividad
Respetar a las personas	Flexibilidad
Fomentar la curiosidad intelectual	Flujos de caja

Anexo 9 Hoja de ruta estratégica del proyecto SiL'K (de la estrategia a la acción)

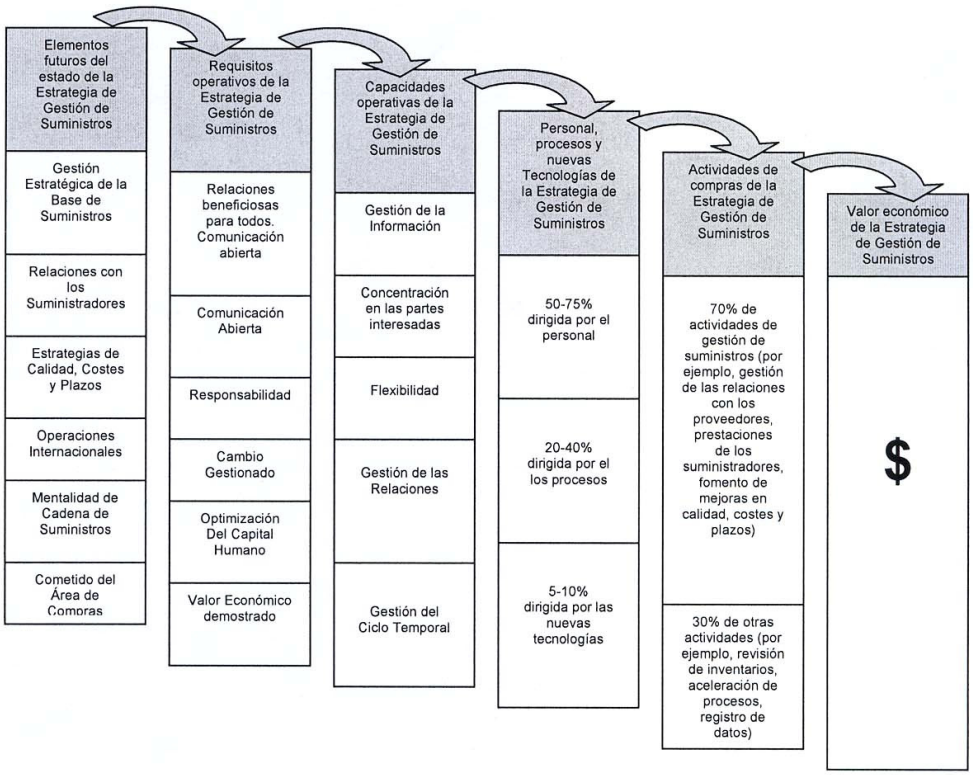

Fuente: Boletín informativo número 3 del proyecto SiL'K de Harley-Davidson.

Anexo 10 Selección de proveedores de software: criterios de decisión y evaluaciones

Se evaluó a cada uno de los proveedores utilizando un enfoque cuantitativo y otro cualitativo. El método cuantitativo se basaba inicialmente en la adecuación existente entre la autoevaluación del proveedor y los requisitos tecnológicos y de procesos que se detallaban en la especificación funcional. También se tuvieron en cuenta la solidez tecnológica y la facilidad de uso de los sistemas.

	Proveedor núm. 1		Proveedor núm. 2		Proveedor núm. 3	
Criterios funcionales	**Valor**	**Adecuación a la especifica-ción**	**Valor**	**Adecuación a la especifica-ción**	**Valor**	**Adecuación a la especifica-ción**
1. Diseños y bases de apoyo	118	98,33 %	120	100,00 %	115	95,83 %
2. Definición de peticiones	232	92,06 %	244	96,83 %	247	98,02%
3. Documentación	140	89,74 %	156	100,00 %	156	100,00 %
4. Recepción	150	93,75 %	156	97,50 %	142	88,75 %
5. Gestión de suministros	48,8	76,25 %	64	100,00 %	59,2	92,50 %
6. Seguimiento del proyecto	22,4	100,00 %	22,4	100,00 %	22,4	100,00 %
7. Asuntos diversos	236	93,65 %	248	98,41 %	248	98,41 %
8. Interfaces	59	98,33 %	60	100,00 %	58	96,67 %
9. Formación	24	100,00 %	24	100,00 %	24	100,00 %
10. Otras cuestiones	112	100,00 %	112	100,00 %	112	100,00 %
Puntuación total del proveedor	1.142,2	93,44 %	1.206,4	98,69 %	1.183,6	96,83 %

Los tres candidatos finalistas se evaluaron también teniendo en cuenta una serie de criterios cualitativos (puntuación B = Baja; M = Media; A = Alta). Todas ellas se dieron con el fin de destacar la comprensión de los proveedores potenciales con respecto a las necesidades actuales y futuras de Harley-Davidson, su capacidad para ofrecer el soporte necesario para la puesta en funcionamiento y la asistencia técnica continua, así como las posibilidades generales de lograr una relación a largo plazo beneficiosa para ambas partes.

	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Criterios cualitativos	**Calificación**	**Calificación**	**Calificación**
1. Potencial de relaciones a largo plazo	A	A	M – A
2. Investigación y desarrollo	M – A	A	M – A
3. Método de formación	A	M – A	M - B
4. Metodología de implementación / Aprendizaje / Gestión del cambio	A	M – A	M
5. Comprensión de las necesidades de Harley	A	M – A	M
6. Capacitación de la Estrategia de Gestión de Suministros (SMS)	M – A	A	M – A
7. Adecuación esperada	M – A	A	M – A
8. Viabilidad económica	M – A	A	M – A
9. Coste	A	B	M
10. Ofertas de soporte técnico	A	A	M
11. Funcionalidad global	A	A	M – A
12. Número de proveedores asociados incluidos en la propuesta de solución informática	M – A	A	M – A
13. Compatibilidad de las arquitecturas	A	M – A	A
14. Portabilidad de plataformas	A	M	A
15. Funcionalidad Internet inmediata	M	A	M - B
16. Experiencia de fabricación	A	M – A	M

Anexo 11 Opiniones de los miembros del equipo del proyecto SiL'K respecto a los tres candidatos finalistas

Proveedor 1
Cotteleer: "Han hecho un trabajo impresionante. Realmente se distinguen de los demás en cuanto que comprenden claramente lo que estamos buscando. En nuestra opinión, nuestras necesidades son bastante similares a las de [otro cliente del Proveedor número 1]. Aparte de eso, han trabajado mucho y han prestado una atención muy especial a lo que queríamos. Se trata de una empresa muy receptiva y han sido enormemente sinceros … Me siento realmente impresionado".
Christianson: "En lo personal, eran impresionantes. Era el tipo más adecuado de personas que se debía enviar a nuestra empresa. Conocían muy bien el software. Sabían perfectamente lo que querían. Cuando acudieron para realizar la presentación, todo el equipo llevaba puestas camisetas de Harley. Eso nos da la impresión de que para ellos es muy importante trabajar con nosotros. Cuando fuimos a sus oficinas a ver sus demostraciones, todo el mundo llevaba camisetas del Proveedor número 1. Eso da idea de que existen muchas probabilidades de que la cultura empresarial de ese equipo esté muy en línea con la nuestra … Creo que su objetivo era responder a todas nuestras preguntas e intentar adaptarse a nuestra cultura, así como intentar vendernos que realmente querían hacer este trabajo para Harley-Davidson, sin ser por ello desagradables, condescendientes o prepotentes, ni ninguna otra cosa por el estilo. Pienso que presentaron muy buenos argumentos a su favor. Otra cosa que me gustó fue que su equipo [central] de trabajo era muestra de la diversidad cultural que impera en el mundo de hoy".
Carter: "Creo que estaba muy claro que habían entendido perfectamente lo que yo había dicho a principios del mes de noviembre. Las personas que participaron en las demostraciones se mostraron apasionadas por su producto, y sabían muy bien lo que su producto podía hacer. También fueron muy rápidos cuando había algo en el guión de la demostración que no se adecuaba a la funcionalidad. En esos casos nos daban siempre una solución alternativa (decían, "No podemos hacerlo así, pero sí podemos hacerlo de esta otra forma"). Eso demuestra que la han leído a fondo (la solicitud de ofertas) y que saben perfectamente lo que puede hacer su software. Para mí, eso es admirable".
Anding: "Probablemente el Proveedor número 1 hizo el mejor trabajo en cuanto a la importancia dada a la dinámica personal, en lo que se refiere a quién era el responsable o quién tenía el dinero respecto a algunos de los elementos del proceso. Fueron muy, muy buenos al asegurarse de que hacían participar a cada uno de nosotros de manera individual en alguno de los aspectos específicos de nuestro equipo. Pusieron toda su atención en mí cuando hablaban de la formación y de cuestiones relacionadas con la gestión del cambio, y centraron toda su atención en las personas del área de compras cuando estaban hablando de funcionalidades concretas".
Jarosz: "El Proveedor número 1 fue realmente impresionante. Sobresalieron para todos nosotros debido a que el entusiasmo que manifestaban esas personas era alucinante. Además, era el grupo más variado de todos, lo cual no dejaba de ser interesante. Hicieron una presentación excelente en la que trataron de todas las áreas. Fueron también muy buenos en los aspectos relacionados con la gestión del cambio, así como en las cuestiones de funcionalidad. En el aspecto personal, cabe decir que todos eran enormemente competentes. En mi opinión, ésa es actualmente su fortaleza principal".
Proveedor 2
Jarosz: "El Proveedor número 2 era exactamente lo que yo había previsto. Llegaron puntualmente y se comportaron muy formalmente. Todos ellos impecablemente vestidos con sus chaquetas y sus corbatas. Y esa formalidad es la impresión dominante que me dio el Proveedor número 2. Hicieron un buen trabajo en las demostraciones; nos hicieron decir más de una vez, "¡Qué bonito queda todo eso en imágenes!". Nos ofrecieron un software de gran calidad, lo cual les distingue

mucho. Se acerca mucho a todos los detalles que habíamos indicado en nuestras especificaciones en muchas de las áreas".

Christianson: "También fueron impresionantes. Y consiguieron serlo durante las cuatro horas de la sesión. Parecía que tenían un software que realmente tenía que incluirse en la ronda final. En las visitas para la demostración, también nos ofrecieron soluciones alternativas en los casos en que no podían satisfacer lo que les habíamos solicitado. Salimos de sus oficinas con lo que íbamos buscando".

Pues: "El Proveedor número 2 era mucho más clásico. [La distinción] entre los dos es que el Proveedor número 1 era más tranquilo y relajado, un poco más en la onda de la mentalidad y la personalidad de Harley. El Proveedor número 2 hizo una presentación comercial mucho más tradicional y cualquiera podía ver la relación jerárquica que había entre sus representantes. Era evidente dónde concentraban su atención dentro del grupo, y uno se daba cuenta de que prestaban más atención a las personas de más rango del grupo que a las demás. Sin embargo, el resultado final es que nos han ofrecido un paquete informático muy, muy bueno".

Proveedor 3

Cotteleer: "Cuando llegó la hora de evaluar los pros y los contras en nuestro análisis de las propuestas, nos encontramos frente a un dilema con éstos, ya que en lo que se refiere a las cuestiones personales, no nos gustan nada, pero en lo que respecta a la funcionalidad de su propuesta no podemos eliminarla así como así. Sacaron una puntuación muy alta, pero no vimos lo suficiente de su producto durante la presentación. Además, existe un tercer factor, que Harley-Davidson contrató recientemente al Proveedor número 3 para otro proyecto diferente".

Webster: [explicando las razones de la sesión extraordinaria] "No podemos descartarlos ni eliminarlos porque no han hecho nada que les permita ser elegidos. Pero si uno echa una ojeada a todo lo que se publica por ahí, puede comprobarse que el Proveedor número 3 tiene muy buena prensa en cuanto a su paquete global de planificación de recursos empresariales (ERP), así como a su sistema informático para el área de Compras".

Carter: "Debemos olvidarnos de las personas y de la presentación y concentrarnos en ver si existe un valor real en su software. Además, creemos de verdad que sí hay algo valioso entre su apariencia y el sistema informático; ésa es la razón por la que todavía están preseleccionados. También sabemos que Harley está negociando con el Proveedor número 3 la contratación de un nuevo proyecto. Por lo tanto, para que nosotros pudiéramos tener la información que necesitamos en caso de que nos fuercen internamente a contratar al Proveedor número 3, deberíamos haberles exigido más. Puede que haya algún tipo de ventaja económica en el caso de que aceptemos su propuesta".

Jarosz: "No creo que yo pudiera darles una buena puntuación en cuanto a funcionalidad, pero sí que les daría un sobresaliente en lo que respecta a puntualidad y habilidades de presentación. No habíamos tenido oportunidad de ver el software de verdad, lo cual era muy importante para conocer la funcionalidad que nos ofrecían. [Durante la sesión extraordinaria] empezamos a darnos cuenta de que el software era muy competitivo con respecto a todos los que habíamos visto anteriormente … Probablemente es muy ventajoso en cuanto al precio. También existen claros beneficios de integración si trabajamos con la misma compañía, siempre y cuando puedan ofrecernos la solución más adecuada".
